
	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Completo por cento		
1		Adote uma praça	22 dias	14/07/15 08:00	12/08/15 17:00	52%		
2	V	Planejamento	3 dias	14/07/15 08:00	16/07/15 17:00	100%		
3	V	Levantamento dos requisitos	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%		
4	✓	Estrutura de projeto	2 dias	14/07/15 08:00	15/07/15 17:00	100%		
5	✓	Boilerplate de configuração	2 dias	15/07/15 08:00	16/07/15 17:00	100%		
6	✓	criação das storyboards	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%		
7		Codificação	15 dias 17/07/15 08:00		06/08/15 17:00	42%		
8	V	Esquema de banco de dados	1 dia	17/07/15 08:00	17/07/15 17:00	100%		
9		T1 - tela principal	4 dias	20/07/15 08:00	23/07/15 17:00	90%		
1 0		T2 - tela de perfil	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%		
11		T3 - Mapa de praças	5 dias	24/07/15 08:00	30/07/15 17:00	70%		
1 2		T4 - Detalhe de praça	2 dias	31/07/15 08:00	03/08/15 17:00	90%		
1 3		T5 - Detalhe de Ação	3 dias	31/07/15 08:00	04/08/15 17:00	0%		
1 4		T6 - Lista de praças	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	50%		
1 5		T7 - Lista de Ações	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%		
1 6		T8 - Lista de cuidadores de uma p	3 dias	04/08/15 08:00	06/08/15 17:00	0%		
17		Implantação	4 dias	07/08/15 08:00	12/08/15 17:00	50%		
1 8	V	preparar máquina de produção	3 dias	07/08/15 08:00	11/08/15 17:00	100%		
19		scripts de carga	2 dias	07/08/15 08:00	10/08/15 17:00	0%		
2 0		publicação	1 dia	12/08/15 08:00	12/08/15 17:00	0%		

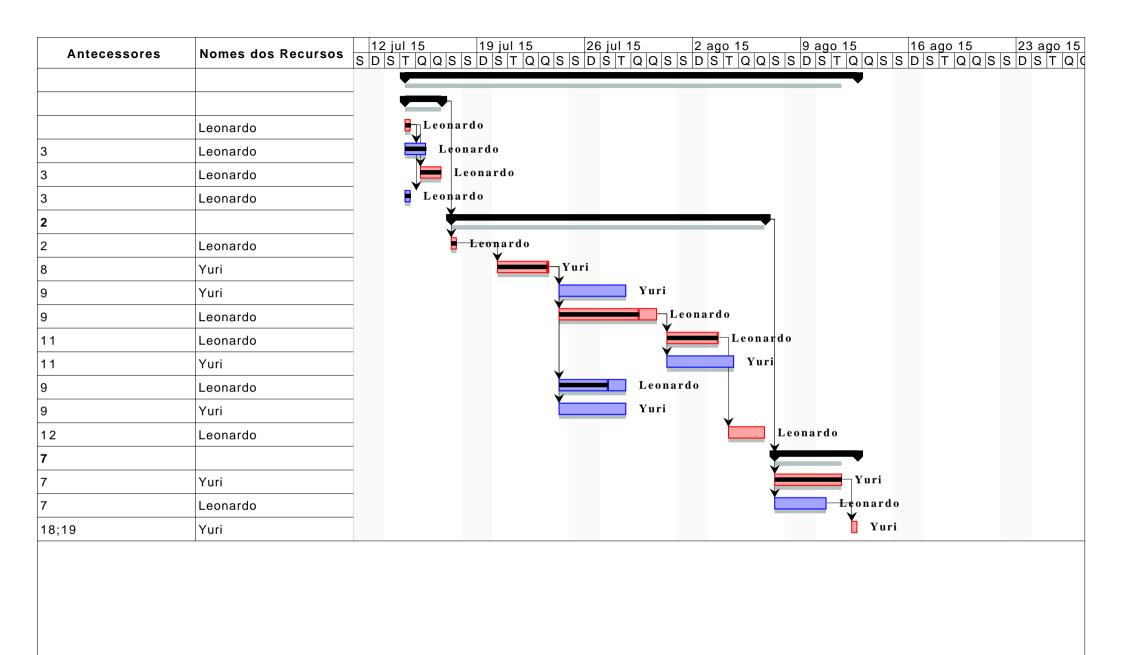

Adote uma praça- Página3																
			30 ago 15								6 set 15					
	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
Adote uma praça- Página3																
			Αc	lot	е	un	na	pı	aç	;a-	Р	ág	in	а3		
